



PVネット兵庫共同ソーラー 発電状況報告

株式会社 みつば電気

2015年5月27日


共同ソーラー概要

設置場所	小野市久保木町
太陽電池メーカー	スマイルソーラ
太陽電池定格出力	54.6kW (260W X 210枚)
パワコンディショナーメーカー	田淵電気
パワコンディショナー定格出力	49.5kW (5.5kW X 9台)
架台設置方式	置き基礎工法 (JISコンクリート架台工)
設置方位	南
パネル設置傾斜角度	10度
発電開始日	平成26年4月11日
売電単価	36円/kWh (税抜)



共同ソーラー発電状況

年間総発電量: 61,535kWh
kW当り発電量: 1,127kWh/kW

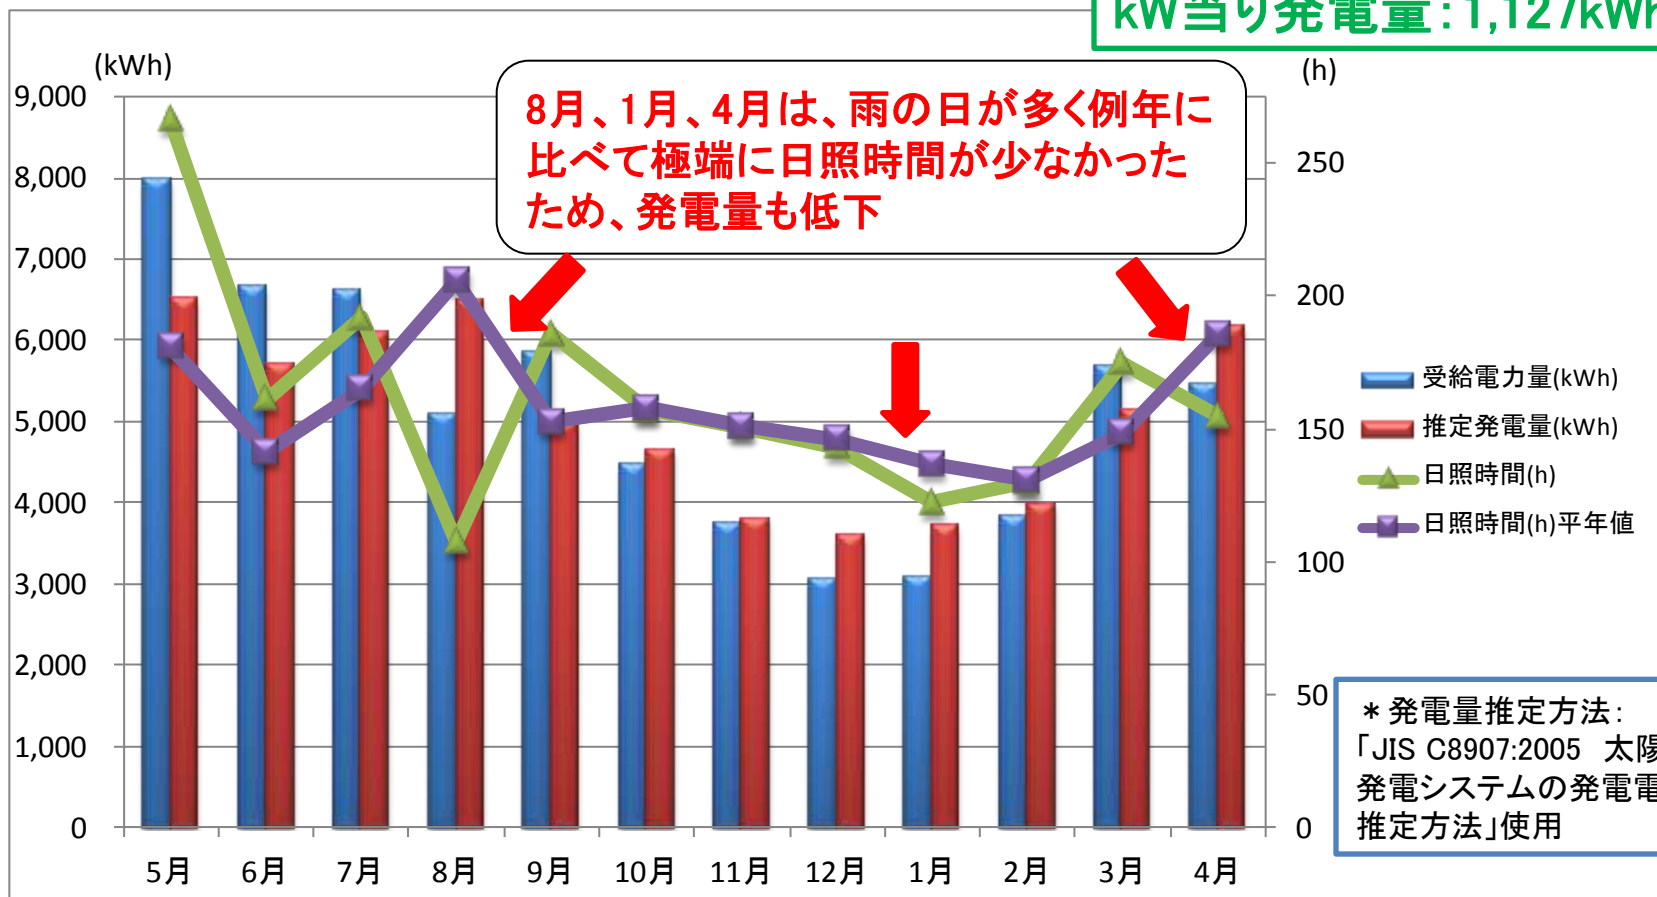

- ・稲刈り後の脱穀でもみ殻がパネルにたまった時は発電量が下がった。
- ・設置者のみつば電気の遠隔監視装置により異常が早期発見できたので、清掃に行き、スムーズに解消できた。
- ・それ以外異常はなし
